Annexe 1 : Plan de situation

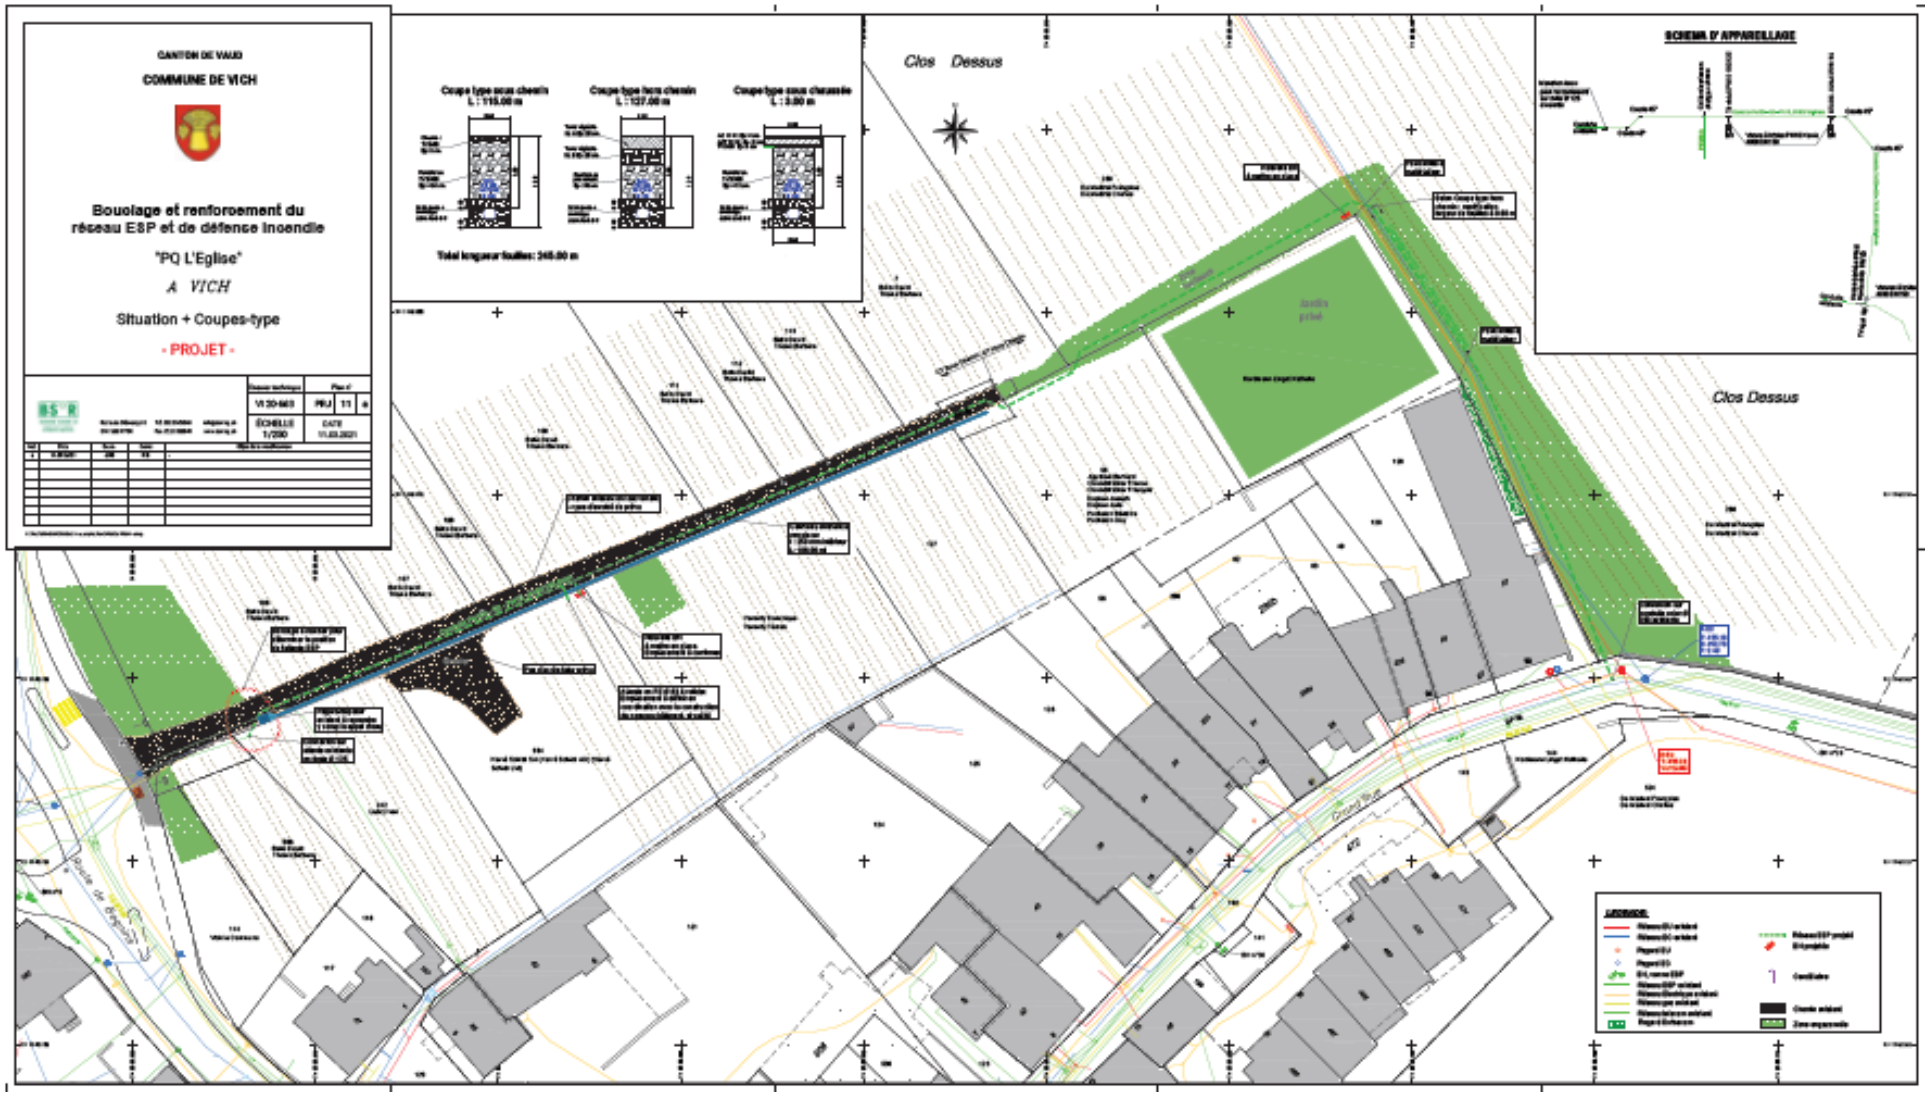

Annexe 2 : Planning provisionnel des travaux

VI 20-663

Création du planning : 26 avril 2021

BSR BERNARD SCHENK SA

Commune de Vich - Eau sous pression - Planning des travaux théorique

		sept.21																													
		J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1
Installation de chantier	Génie civil																														
Fouille pour canalisations	Génie civil																														
Raccordement des canalisations d'ESP	Sutter & Fils																														
Remblayage des fouilles	Génie civil																														
Raccordement finaux, mise en eau et tests	Sutter & Fils																														
Remise en état	Génie civil																														
Finitions	Génie civil																														
Ensemencement	Génie civil																														
Aléas																															

	oct.21															
	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Installation de chantier																
Fouille pour canalisations																
Raccordement des canalisations d'ESP																
Remblayage des fouilles																
Raccordement finaux, mise en eau et tests																
Remise en état																
Finitions																
Ensemencement																
Aléas																

Début des travaux théorique. La date de démarrage des travaux reste à définir.

Durée des travaux : 1,5 mois.
